INFORME DE SITUACIÓN

Obras e infraestructura en la provincia de Catamarca

Obras ejecutadas y en ejecución

Fecha de corte: 10 de octubre de 2026

índice

índice 2
Introducción 3
1. Resumen ejecutivo 4
2. Alcance y criterios 5
3. Ruta Provincial 34 – Camino de Chuquisaca 6
3.1 Cronología y estado 6
3.2 Lectura crítica 7
4. Centro Comercial de Valle Chico 8
4.1 Cronología 8
4.2 Rubros demandados 9
4.3 Posturas 9
5. Otras obras en la provincia 10
5.1 Vialidad 10
5.2 Agua 11
5.3 Energía, vivienda y otras 12
6. Financiamiento y contexto fiscal 14
7. Conclusiones y riesgos 15
Fuentes 15

Introducción

Este informe presenta un panorama de las obras e infraestructura ejecutadas y en ejecución en la provincia de Catamarca, con fecha de corte al 10 de octubre de 2026. Reúne información oficial y periodística sobre proyectos viales, comerciales, hídricos, energéticos y habitacionales, con el fin de ofrecer una lectura ordenada del estado de avance, el financiamiento y los desafíos pendientes.

El análisis se centra en dos obras prioritarias: la Ruta Provincial 34, financiada con regalías mineras y fondos propios, que completó la apertura de unos 135 km entre Palo Blanco y la RP 43 y fortalece la integración territorial de la Puna, y por otro lado el Centro Comercial de Valle Chico, un esquema con inversión privada y sin pagos mensuales del Estado, pensado para ampliar los servicios de un barrio de unas 4.500 familias. Completan el panorama la Ruta Provincial 1, el puente sobre el río Santa María, los acueductos y los programas de vivienda.

El informe considera también el contexto fiscal: la obra pública nacional en la provincia sufrió un recorte superior a $7.000 millones, con mayor incidencia sobre la Ruta Nacional 38, lo que otorga mayor peso a la inversión privada y de administración provincial.

1. Resumen ejecutivo

Catamarca combina en 2026 dos tipos de intervención: una obra vial de integración territorial en la Puna, financiada con recursos propios y regalías mineras, y un esquema de obra con inversión privada para dotar de servicios a un barrio de gran tamaño de la Capital. Al mismo tiempo, la obra pública nacional en la provincia depende de créditos externos y sufrió recortes.

Hallazgo	Dato
Ruta Provincial 34	Apertura completa de ~135 km entre Palo Blanco (Tinogasta) y la RP 43 (Antofagasta de la Sierra), anunciada el 1/10/2026
Centro Comercial Valle Chico	Presupuesto oficial $2.808.681.978,93; 270 días; 32–33 locales; apertura de la mayoría prevista antes de fin de año
Ruta Provincial 1	Última etapa de pavimentación Valle Central–Aconquija en ejecución (Loma Larga–Las Chacritas)
Agua	Acueducto Albigasta (BID) de $99.769 M y 36 meses; Acueducto Norte para ~100.000 habitantes
Presupuesto nacional	Recorte de >$7.000 M (≈40 % de las partidas 2026), 86 % sobre la RN 38

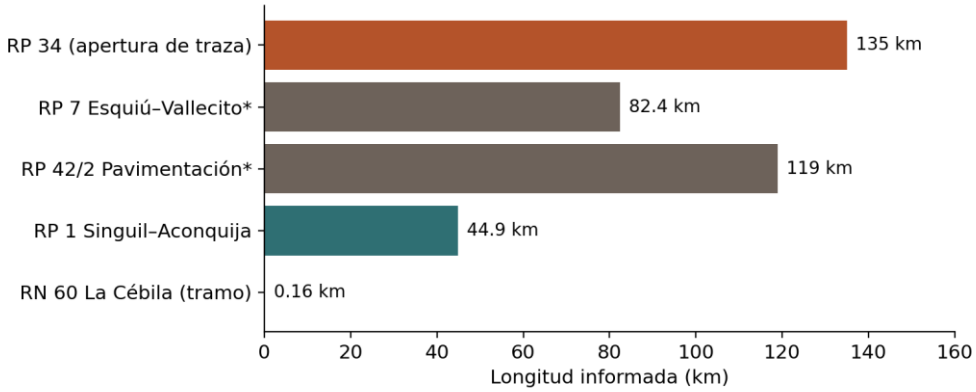


Gráfico 1. Longitud de obras viales informadas (datos de convocatoria 2023)

2. Alcance y criterios

El informe reúne información periodística y oficial publicada hasta el 10/10/2026. Se clasificó cada obra según su relevancia: Prioritaria (eje del informe), Alta (impacto regional o de gran inversión) y Media (impacto local). Cuando una fuente es antigua o las cifras difieren, se aclara en el texto.

- **Prioritaria:** Ruta Provincial 34 y Centro Comercial de Valle Chico.
- **Alta:** Ruta Provincial 1, acueducto Albigasta, puente sobre el río Santa María (RP 149).
- **Media:** acueductos urbanos, interconexión eléctrica en la Puna, viviendas y mantenimiento de rutas nacionales.

3. Ruta Provincial 34 – Camino de Chuquisaca

★OBRA RELEVANTE · PRIORITARIA **Ruta Provincial 34 (Palo Blanco – RP 43)**	
Estado	Apertura de traza completada (1/10/2026). No es ruta pavimentada.
Longitud	~135 km (secciones: 24 + 26 + 84 km)
Recorrido	Palo Blanco (Tinogasta) – Chuquisaca – Agua del Médano – empalme RP 43, a ~10 km de El Peñón
Ejecución	Sección I, trabajos previos; secciones II y III (111 km) por administración de Vialidad Provincial
Financiamiento	Regalías mineras y fondos propios, según editorial de El Esquiú (5/10/2026)
Dificultad	Desnivel cercano a 2.000 m en montaña; suelos arenosos de origen volcánico en la Puna
Impacto previsto	Turismo (Campo de Piedra Pómez), producción, transporte e integración territorial

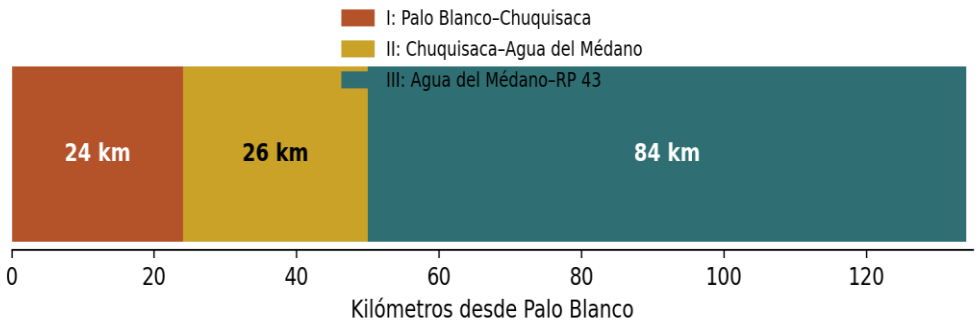


Gráfico 2. Secciones de la Ruta Provincial 34 (Vialidad Provincial, 1/10/2026). Las secciones suman 134 km; la fuente redondea a 135.

3.1 Cronología y estado

- Primera etapa: apertura de las secciones II y III por administración, hasta unir los frentes desde Tinogasta y Antofagasta de la Sierra.
- Segunda etapa (mayo 2026): desde El Peñón por la RP 43 hasta el empalme con la RP 34, 80 km en total, con los primeros 27 km en ejecución en montaña profunda.
- Piedra Pómez: se mejoró el acceso al Campo de Piedra Pómez.
- Seguridad: a fines de septiembre se informó que el tramo de la RP 43 entre Chuquisaca y Piedra Pómez no está habilitado al tránsito por tratarse de zona de obra.
- Habilitación: el 30/09/2026 se titularon anuncios sobre habilitar el camino Fiambalá–El Peñón; confirmar la fecha oficial.



Fotografía 1. Ruta 34, tramo de montaña



Fotografía 2. Ruta 34, zona de Chuquisaca / Puna

3.2 Lectura crítica

La apertura de traza es un hito logístico, pero el impacto en turismo y producción todavía no fue medido. Para transformarla en camino consolidado serán necesarios trabajos de calzada, drenaje y señalización, y un mantenimiento permanente en zonas de nieve y arena.

4. Centro Comercial de Valle Chico

★OBRA RELEVANTE · PRIORITARIA Centro Comercial / Paseo Comercial Valle Chico	
Ubicación	Barrio Valle Chico, sur de la Capital; ~4.500 familias (30/9/2026; antes se hablaba de más de 4.000)
Presupuesto oficial	$2.808.681.978,93 (Licitación Privada N° 1/2025)
Plazo	270 días corridos
Modalidad	El contratista aporta materiales y mano de obra y recupera la inversión con la venta de locales; sin pagos mensuales del Estado
Componentes	32 locales, 12 islas comerciales, sanitarios, depósitos, estacionamiento, bici/moto, espacios verdes, food trucks, cancha multiuso y feria artesanal
Locales	32 (anuncio 2025), 33 (licitación 2026) y ~40 (declaración de la FEC, julio 2026)
Estado	En construcción; locales en licitación privada con apoyo de la Federación Económica
Apertura	Mayoría de los locales antes de diciembre de 2026; supermercado en segunda etapa

4.1 Cronología

Fecha	Hito
Jun 2025	Anuncio del proyecto, apertura de sobres; dos empresas ofertaron
Nov 2025	El Ministerio informa que la obra avanza a buen ritmo
Mar 2026	Consulta a vecinos sobre rubros deseados
Jul 2026	Convenio entre Vivienda (IPV) y la Federación Económica de Catamarca
30 Sep 2026	Reunión con pymes por la licitación de 33 locales
Dic 2026	Apertura prevista de la mayoría de los locales




Fotografía 3. Obra del Centro Comercial de Valle Chico



Fotografía 4. Vista del barrio Valle Chico

4.2 Rubros demandados

La consulta vecinal priorizó supermercado, gimnasio, farmacia y bar. La Federación Económica indicó que buscará evitar la superposición de rubros y que en la asignación pesarán los antecedentes comerciales.

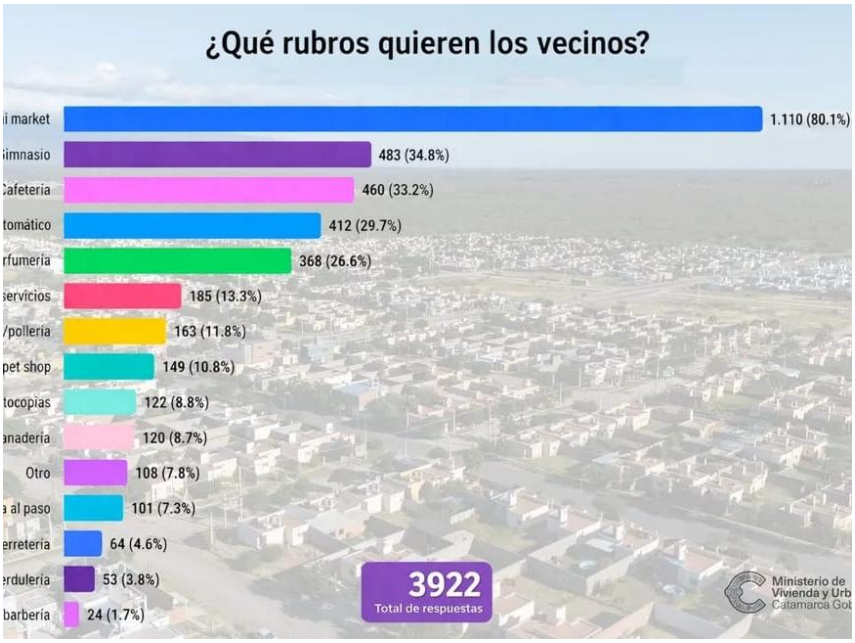

Fotografía 5. Encuesta realizada por el Ministerio de vivienda

4.3 Posturas

- El proyecto se presenta como un modelo de ejecución sin pagos mensuales del Estado. Se prevé que contribuya a ampliar la oferta de servicios comerciales y a generar oportunidades de empleo local para las familias del barrio Valle Chico

5. Otras obras en la provincia

5.1 Vialidad

★OBRA RELEVANTE · ALTA	Ruta Provincial 1 – Valle Central a Aconquija
Estado	Último tramo (Loma Larga–Las Chacritas) con colocación de carpeta asfáltica; avance general 95 % en enero 2026
Detalle	Proyecto de 44,9 km entre Singuil y Aconquija, iniciado con inversión nacional de $1.407 M (dato histórico)
Ejecuta	Vialidad Provincial; calzada reducida a una mano en la zona de trabajos (29/9/2026)

★OBRA RELEVANTE · ALTA	Puente sobre el río Santa María – RP 149
Longitud	350 metros; el más largo de su tipo en la provincia
Beneficio	Conexión permanente de Las Mojarras, El Puesto y localidades vecinas
Fuente	Editorial de El Esquiú, 5/10/2026

- Ruta Nacional 60, Quebrada de La Cébila: pavimentación de 160 m x 7 m en el km 1.134, con convenio Nación-Provincia (julio 2026).
- RP 42 / RP 2: la pavimentación figura próxima a concluir según un portal local; verificar.
- RP 7 Esquiú–Vallecito (82,4 km, $5.673 M según convocatoria nacional antigua): estado actual no verificado.
- RN 38: repavimentación en el Presupuesto 2027 (límite La Rioja – río Ongolí).



Fotografía 5. Ruta Provincial 1 y Puente sobre el río Santa María

5.2 Agua

★OBRA RELEVANTE · ALTA	**Acueducto y plantas potabilizadoras Albigasta (Quirós–Frías)**
Inversión	$99.769 M con crédito BID; el Presupuesto 2027 lo lista con $97.753 M
Alcance	2 plantas potabilizadoras y 50 km de acueducto; ~36.000 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero
Plazo	36 meses desde la firma de inicio (agosto 2026)

- Acueducto Norte (Capital): inaugurado con fondos provinciales de ~$2.000 M, para ~100.000 habitantes.
- Acueducto Valle Viejo: $1.013 M, 83,7 % de avance según el Mapa de Inversiones (inicio 2023; dato posiblemente atrasado).
- Cisterna Cruz Negra: $499 M, 92,6 % de avance (Mapa de Inversiones).
- Acueducto Motegasta–Recreo: en construcción (agosto 2026).

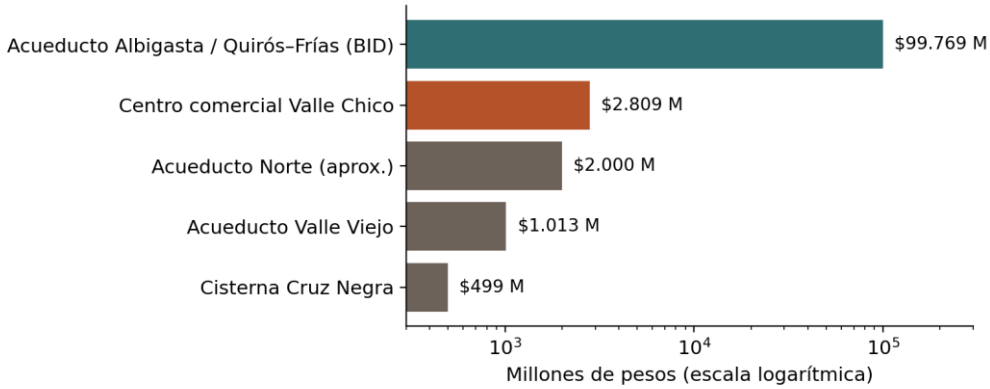


Gráfico 3. Inversión informada (escala logarítmica por la diferencia de magnitudes)

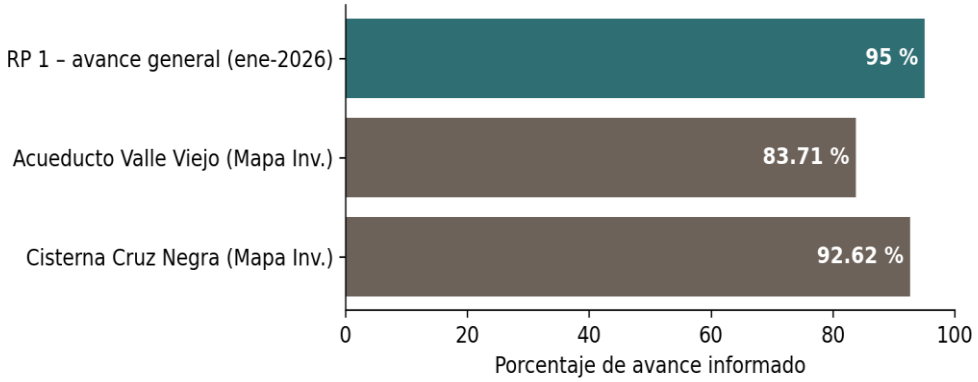


Gráfico 4. Avance informado de obras selecionadas (fechas de corte distintas)

5.3 Energía, vivienda y otras

- Interconexión eléctrica de la Puna: en febrero de 2026 se habilitó un tramo de 17 km de línea de 33 kV entre Villa Vil y Barranca Larga (Energía de Catamarca SAPEM).

- Viviendas entregadas y en construcción: En lo que va del 2025 y 2026 se puede decir que se va generando aproximadamente de 950 soluciones habitacionales entre viviendas, mejoramientos, módulos habitaciones, erradicación de letrinas algunas ya entregadas y otras se encuentran proceso de construcción que benefician familias en toda la Provincia. Se puede destacar las 77 viviendas ubicadas en el norte de la ciudad Capital; los 152 Dúplex licitados que se encuentran en Valle chico.

  A su vez se encuentran entregadas 11 viviendas sociales en Santa María, además de obras deportivas, Las viviendas para profesionales con un total de 175 ubicadas en el Loteo Pako Rojas, de las cuales son 150 para grupo familiar y 25 de solteros; los colegios profesionales participantes han sido Colegio de Abogados de Catamarca, Unión de Arquitectos de Catamarca, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Colegio Médico de Catamarca, Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas. También las 122 viviendas sociales ubicadas en el loteo Marcolli entregadas a las familias más vulnerables; 20 viviendas en El Peñón. 90 viviendas de casa propia en tinogasta

  Se Puede destacar uno de los programas es el más grande de su tipo en el país que es el Programa de Autoconstrucción de Viviendas ubicado en los Plateados Departamento Valle Viejo donde se entregó 215 lotes con servicios y se proyectó la entrega de 35 lotes adicionales para llegar a los 250. Actualmente se encuentra en la 2° etapa de 12 etapas de desembolso de materia lo que significa altura de 1 mts. De mampostería. Cabe destacar que hay familias que han ido avanzando en el proceso de la obra de manera particular y por su propia iniciativa.

  Por medio de este programa también se entregó 45 terrenos que se encuentra en el Loteo Herr Departamento Fray mamerto Esquiu del cual cuentan con todos los servicios en distintas etapas de inicio de obra; actualmente se encuentra en su gran mayoría entre la etapa 3 y 4 de 6 etapas de desembolso de materiales. Con proyección de finalización en diciembre de acuerdo con el avance de cada familia.

  Por Medio de convenios firmados entre el Ministerio de Vivien con los diferentes municipios, se avanzó en propuestas de autoconstrucción aportando el municipio la mano de obra y el ministerio los materiales, de las cuales se encuentran en diferentes instancias de obra. Como ser el Municipio de Hualfin se encuentra en la 1° etapa de obra de 10 viviendas, el Municipio de Huillapima en etapa 2 de 10 viviendas, Los Varelas etapa 1 de 1 vivienda y 5 terminaciones y/o mejoramientos

  En lo que respecta a obras de infraestructura se puede decir que son alrededor de 20 de las cuales se encuentran comprendidas en nivelaciones, red de agua, cloaca, eléctrica algunas ya finalizas y otras en ejecución, cabe destacar que estas obras se llevan a cabo en los diferentes departamentos y zonas de capital que son relevantes para llevar a cabo la ejecución de las viviendas.

  En cuanto a Clubs, ONG y Centros vecinales se han intervenido cerca de 30, con refacciones, ampliación donación de materiales y convenios también con firma de convenio como ser intervención en 10 clubes pozo piedra y puerta de San José, entre otros Municipios del Departamento Belén.



Fotografía 6. Acueductos u otras obras (insertar imagen propia)

6. Financiamiento y contexto fiscal

El Presupuesto nacional 2026 asignó $19.707 M para obras en Catamarca, cifra baja frente a los más de $1,08 billones de transferencias totales. Luego, el ajuste recortó más de $7.000 M, casi el 40 % de esas partidas, y el 86 % del recorte afectó la RN 38.

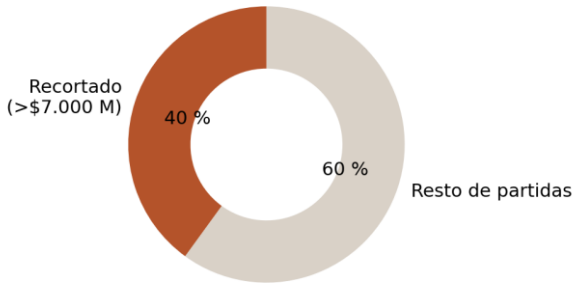


Gráfico 5. Recorte sobre partidas de infraestructura 2026 (aprox. 40 %)

En contraste, la RP 34 se financia con regalías mineras y fondos propios, y Valle Chico con inversión privada recuperada mediante venta de locales. El Presupuesto 2027 incorpora el acueducto Quirós–Frías con $8.098,5 M para el próximo ejercicio y un esquema de incentivos tributarios para privados en rutas nacionales.

7. Conclusiones y riesgos

- La RP 34 completó la apertura, pero necesita consolidación, habilitación formal y medición de su impacto.
- Valle Chico depende de la ocupación real de los locales y del cumplimiento del plazo de diciembre.
- La dependencia de créditos externos y la caída de fondos nacionales aumentan el peso de la inversión provincial y privada.
- Varios datos (RP 7, RP 42, Valle Viejo, Cruz Negra) provienen de fuentes antiguas y deben actualizarse antes de publicar.

Fuentes

- Gobierno de Catamarca
  https://instagram.com/catamarcagob?exln=MXVoOHd4Mm1pczR3cQ%3D%3D
  https://portal.catamarca.gob.ar/noticias/discurso-completo-del-gobernador-raul-jalil-ante-la-asamblea-legislativa
- Ministerio de Vivienda y Urbanización – IPV
  https://instagram.com/ipvcatamarca?cplk=MW0zMm5jcDhza3h6bA%3D%3D
  https://instagram.com/viviendas_catamarca?rpxt=ajExZ2hlN3QwM3p1
- Inforama (10/06/2025; 01/10/2026)
- El Esquiú (13/06/2025; 18/11/2025; 10/03/2026; 31/07/2026; 30/09/2026; 05/10/2026)
- Catamarca Actual (18/05/2026; 28/07/2026; 29/09/2026)
- El Ancasti (19/05/2026; recorte de obras 2026)
- El Monterizo; El Destape; El Liberal; La Unión Digital; Radio Cataratas
- Construar (05/01/2026); El Diario de Catamarca (27/02/2026)
- Aguas de Catamarca; Mapa de Inversiones (Argentina.gob.ar)
